



Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответственный	Статус	% заверш.	Длительность	Начало	Окончание	Предшествен	018 Ию	Кв. 3, 2018 Июл	Кв. 4, 2018 Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
1		<b>1</b>	<b>м. Київ, Медичний центр на 340м2</b>			45%	91 дней	Ср 18.07.18	Ср 21.11.18								
2		1.1	Авторський нагляд - оформити	ALFA Project	готово	100%	5 дней	Чт 26.07.18	Ср 01.08.18								
3		1.2	Технічний нагляд - оформити	ALFA Project	готово	100%	5 дней	Чт 26.07.18	Ср 01.08.18								
4		<b>1.3</b>	<b>Підготовчі роботи</b>			90%	18 дней	Ср 18.07.18	Пт 10.08.18								
5		1.3.1	Тимчасова електрика та вода	Замовник	готово	100%	3 дней	Ср 18.07.18	Пт 20.07.18								
6		1.3.2	Монтаж тимчасового унітазу та мийки	Юрій Іовенко	готово	100%	1 день	Пн 23.07.18	Пн 23.07.18	5							
7		1.3.3	Виконання штроб для ВК	Руслан	готово	100%	3 дней	Пн 23.07.18	Ср 25.07.18	5							
8		1.3.4	Нарізання деформ. швів 5мм (сітка 3х3м по стяжці)	Юрій Іовенко	готово	100%	2 дней	Пн 23.07.18	Вт 24.07.18	5							
9		1.3.5	Демонтаж стяжки під цегляні перегородки	Юрій Іовенко	готово	100%	1 день	Пн 23.07.18	Пн 23.07.18	5							
10		1.3.6	Розмітка перегородок	Юрій Іовенко	готово	100%	1 день	Вт 24.07.18	Вт 24.07.18	9							
11		1.3.7	Уташтування 2-х приоб'єктних складів	Юрій Іовенко	готово	100%	8 дней	Ср 25.07.18	Пт 03.08.18	10							
12		1.3.8	Перенесення радіаторів опалення	МТС	в роботі	50%	5 дней	Пн 06.08.18	Пт 10.08.18	11							
13		<b>1.4</b>	<b>Роботи основного періоду</b>			38%	86 дней	Ср 25.07.18	Ср 21.11.18								
14		<b>1.4.1</b>	<b>Ремонтно-оздоблювальні роботи</b>			20%	79 дней	Ср 25.07.18	Пн 12.11.18								
15		1.4.1.1	Улаштування перегородок із цегли	Юрій Іовенко	готово	100%	10 дней	Ср 25.07.18	Вт 07.08.18	11НН							
16		1.4.1.2	Улаштування отворів ВК в перекритті	Руслан	готово	100%	2 дней	Ср 25.07.18	Чт 26.07.18	15НН							
17		1.4.1.3	Улаштування закладних для скл. перегородок	Олег Ворошун	готово	100%	3 дней	Пн 30.07.18	Ср 01.08.18	15НН+3 дней;1							
18		1.4.1.4	Штукатурка стін та перегородок (всі приміщення)	Юрій Іовенко	готово	0%	8 дней	Чт 16.08.18	Пн 27.08.18	31;32;38;40;45;							
19		1.4.1.5	Монтаж гіпсокартонної стелі (коридор та ресепшн)	Юрій Іовенко	в роботі	50%	5 дней	Вт 28.08.18	Пн 03.09.18	18;62;65;66							
20		1.4.1.6	Монтаж гіпсокартонної стелі (інші приміщення)	Юрій Іовенко	в роботі	50%	8 дней	Вт 04.09.18	Чт 13.09.18	62;65;66;19							
21		1.4.1.7	Армування стін та перегородок	Юрій Іовенко	готово	0%	5 дней	Вт 28.08.18	Пн 03.09.18	18							

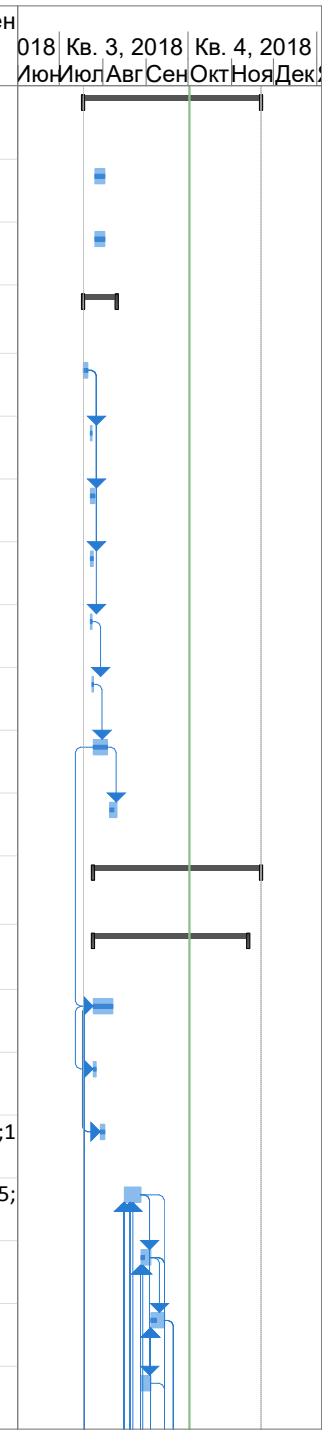

Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответственный	Статус	% заверш.	Длительность	Начало	Окончание	Предшествен	018   Кв. 3, 2018   Кв. 4, 2018   Ию   Июл   Авг   Сен   Окт   Ноя   Дек
22		1.4.1.8	Армування гіпсокартонної стелі	Юрий Иовенк		0%	5 дней	Пт 14.09.18	Чт 20.09.18	20;18;21;19	
23		1.4.1.9	Облицовання стін плиткою	Юрий Иовенк		0%	10 дней	Пт 14.09.18	Чт 27.09.18	19;20	
24		1.4.1.10	Облицовання підлоги плиткою	Юрий Иовенк		0%	10 дней	Пт 14.09.18	Чт 27.09.18	19;20	
25		1.4.1.11	Монтаж Внутрішних дверей	Постачальник	Домовитис	0%	3 дней	Пт 28.09.18	Вт 02.10.18	23	
26		1.4.1.12	Монтаж потолочних багетів (всі приміщення)	Юрий Иовенк		0%	8 дней	Пт 21.09.18	Вт 02.10.18	22	
27		1.4.1.13	Монтаж плинтусу (всі приміщення)	Юрий Иовенк		0%	8 дней	Ср 03.10.18	Пт 12.10.18	26	
28		1.4.1.14	Молярні роботи (всі приміщення)	Юрий Иовенк		0%	20 дней	Пн 15.10.18	Пт 09.11.18	27	
29		1.4.1.15	Здавання робіт	Юрий Иовенк		0%	1 день	Пн 12.11.18	Пн 12.11.18	28	
30		1.4.2	Монтаж Електричних систем			68%	79 дней	Вт 31.07.18	Пт 16.11.18		
31		1.4.2.1	Прокладання кабелів	Иван Веретко	готово	100%	10 дней	Вт 31.07.18	Пн 13.08.18	15НН+4 дней	
32		1.4.2.2	Монтаж ЩСО (2 шт.)	Иван Веретко	готово	100%	2 дней	Вт 14.08.18	Ср 15.08.18	31	
33		1.4.2.3	Улаштування підрозетників	Иван Веретко	в роботі	50%	2 дней	Вт 14.08.18	Ср 15.08.18	31	
34		1.4.2.4	Монтаж кінцевих приладів	Иван Веретко		0%	3 дней	Пн 12.11.18	Ср 14.11.18	28	
35		1.4.2.5	Пуско-налагодні роботи	Иван Веретко		0%	1 день	Чт 15.11.18	Чт 15.11.18	34	
36		1.4.2.6	Здавання робіт	Иван Веретко		0%	1 день	Пт 16.11.18	Пт 16.11.18	35	
37		1.4.3	Монтаж систем Водопроводу та каналізації			62%	81 дней	Вт 31.07.18	Вт 20.11.18		
38		1.4.3.1	Прокладання водопроводу	Руслан	готово	100%	3 дней	Вт 31.07.18	Чт 02.08.18	15НН+4 дней	
39		1.4.3.2	Пуско-налагодні роботи (перевірка під тиском)	Руслан	готово	100%	1 день	Пт 03.08.18	Пт 03.08.18	38	
40		1.4.3.3	Прокладання каналізації	Руслан	готово	100%	4 дней	Пт 03.08.18	Ср 08.08.18	38	
41		1.4.3.4	Монтаж та підключення бойлерів	Руслан		0%	2 дней	Пн 12.11.18	Вт 13.11.18	38;28	
42		1.4.3.5	Монтаж та підключення сантех приладів	Руслан		0%	2 дней	Пн 12.11.18	Вт 13.11.18	38;40;28	



Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответственный	Статус	% заверш	Длительность	Начало	Окончание	Предшествен	018   Кв. 3, 2018   Кв. 4, 2018   Юн Юл Авг Сен Окт Ноя Дек
43		1.4.3.6	Здавання робіт	Руслан		0%	1 день	Вт 20.11.18	Вт 20.11.18	39;35;48;54	
44		1.4.4	Монтаж систем СКС, СКУД, Відео нагляду			58%	81 днів	Вт 31.07.18	Вт 20.11.18		
45		1.4.4.1	Прокладання кабелів	Александр Ер	готово	100%	10 днів	Вт 31.07.18	Пн 13.08.18	15НН+4 днів	
46		1.4.4.2	Улаштування підрозетників	Александр Ер	в роботі	50%	2 днів	Вт 14.08.18	Ср 15.08.18	45	
47		1.4.4.3	Монтаж та підключення кінцевих приладів	Александр Ер		0%	5 днів	Пн 12.11.18	Пт 16.11.18	28	
48		1.4.4.4	Пуско-налагодні роботи	Александр Ер		0%	1 день	Пн 19.11.18	Пн 19.11.18	47	
49		1.4.4.5	Здавання робіт	Александр Ер		0%	1 день	Вт 20.11.18	Вт 20.11.18	48	
50		1.4.5	Монтаж пожежної сигналізації			53%	81 днів	Вт 31.07.18	Вт 20.11.18		
51		1.4.5.1	Прокладання кабелів	Брама НТБ	готово	100%	10 днів	Вт 31.07.18	Пн 13.08.18	15НН+4 днів	
52		1.4.5.2	Улаштування підрозетників	Брама НТБ		0%	2 днів	Вт 14.08.18	Ср 15.08.18	51	
53		1.4.5.3	Монтаж та підключення кінцевих приладів	Брама НТБ		0%	5 днів	Пн 12.11.18	Пт 16.11.18	28	
54		1.4.5.4	Пуско-налагодні роботи	Брама НТБ		0%	1 день	Пн 19.11.18	Пн 19.11.18	53	
55		1.4.5.5	Здавання робіт	Брама НТБ		0%	1 день	Вт 20.11.18	Вт 20.11.18	54	
56		1.4.6	Монтаж системи Вентиляції			65%	18 днів	Вт 31.07.18	Чт 23.08.18		
57		1.4.6.1	Прокладання Воздуховодів	Александр	готово	100%	10 днів	Вт 31.07.18	Пн 13.08.18	15НН+4 днів	
58		1.4.6.2	Монтаж Дрессель-кранів	Александр	готово	100%	2 днів	Вт 14.08.18	Ср 15.08.18	57	
59		1.4.6.3	Заміна склопакету на Сендвіч	ALFA Project	в роботі	25%	2 днів	Вт 07.08.18	Ср 08.08.18	57НН+5 днів	
60		1.4.6.4	Монтаж припливного отвору та решітки	Александр	в роботі	25%	2 днів	Чт 16.08.18	Пт 17.08.18	58	
61		1.4.6.5	Монтаж та підключення Витяжної установки	Александр	готово	0%	2 днів	Пн 20.08.18	Вт 21.08.18	60;59	
62		1.4.6.6	Пуско-налагодні роботи	Александр		0%	1 день	Ср 22.08.18	Ср 22.08.18	61	
63		1.4.6.7	Здавання робіт	Александр		0%	1 день	Чт 23.08.18	Чт 23.08.18	62	

Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответствен	Статус	% заверш	Длительн	Начало	Окончание	Предшествен	018   Кв. 3, 2018   Кв. 4, 2018   Июл   Авг   Сен   Окт   Ноя   Дек
64		1.4.7	<b>Монтаж системи Кондиціонування</b>			46%	82 днів	Вт 31.07.18	Ср 21.11.18		
65		1.4.7.1	Прокладання Фреоноводів	Александр	готово	100%	5 днів	Вт 31.07.18	Пн 06.08.18	15НН+4 днів	
66		1.4.7.2	Монтаж Дренажних патрубків	Александр	готово	100%	3 днів	Вт 07.08.18	Чт 09.08.18	65	
67		1.4.7.3	Монтаж та підключення Зовнішнього блоку	Александр	в роботі	25%	3 днів	Пт 10.08.18	Вт 14.08.18	66	
68		1.4.7.4	Монтаж та підключення Внутрішніх блоків	Александр		0%	5 днів	Пн 12.11.18	Пт 16.11.18	28;67;66	
69		1.4.7.5	Пуско-налагодні роботи	Александр		0%	2 днів	Пн 19.11.18	Вт 20.11.18	68	
70		1.4.7.6	Здавання робіт	Александр		0%	1 день	Ср 21.11.18	Ср 21.11.18	69	
71		1.4.8	<b>Монтаж скляних перегородок</b>			0%	18 днів	Пт 28.09.18	Вт 23.10.18		
72		1.4.8.1	Обміри проємів (після укладання плитки підлоги)	Олег Ворошун		0%	2 днів	Пт 28.09.18	Пн 01.10.18	23	
73		1.4.8.2	Монтаж скляних перегородок	Олег Ворошун		0%	7 днів	Чт 11.10.18	Пт 19.10.18	72ОН+7 днів	
74		1.4.8.3	Здавання робіт	Олег Ворошун		0%	2 днів	Пн 22.10.18	Вт 23.10.18	73	
